

第104号議案

長岡第九小学校給食室・放課後児童クラブ等整備工事請負契約の
変更について

長岡第九小学校給食室・放課後児童クラブ等整備工事の請負契約を次のとおり変更することについて、議会の議決を求める。

令和4年12月21日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

工 事 名	長岡第九小学校給食室・放課後児童クラブ等 整備工事	
請負金額	変更前	503,976,000円
	変更後	709,715,600円
請 負 人	京都府亀岡市大井町南金岐尾垣内9番地 株式会社三煌産業 代表取締役 渡 辺 裕 昭	

(提案理由)

長岡第九小学校給食室・放課後児童クラブ等整備工事において、給食室建築部分の杭施工に支障となる地中埋設物の撤去等を行うため、請負契約を変更する必要があるので提案する。

(参考)

1 工事場所

長岡京市東神足2丁目地内

2 変更工事概要

- ・給食室建築部分の地中埋設物撤去等の追加
(工法の見直し、排水の仮設迂回等)
- ・工期延長に伴う仮設・安全対策の追加等

3 変更請負代金

当初請負金額 503,976,000円

変更請負金額 709,715,600円


(205,739,600円の増額)

4 工期

当初工期 令和4年6月23日～令和5年10月2日

変更工期 令和4年6月23日～令和6年10月2日

旧放課後児童クラブ施設を
地域開放施設に改修

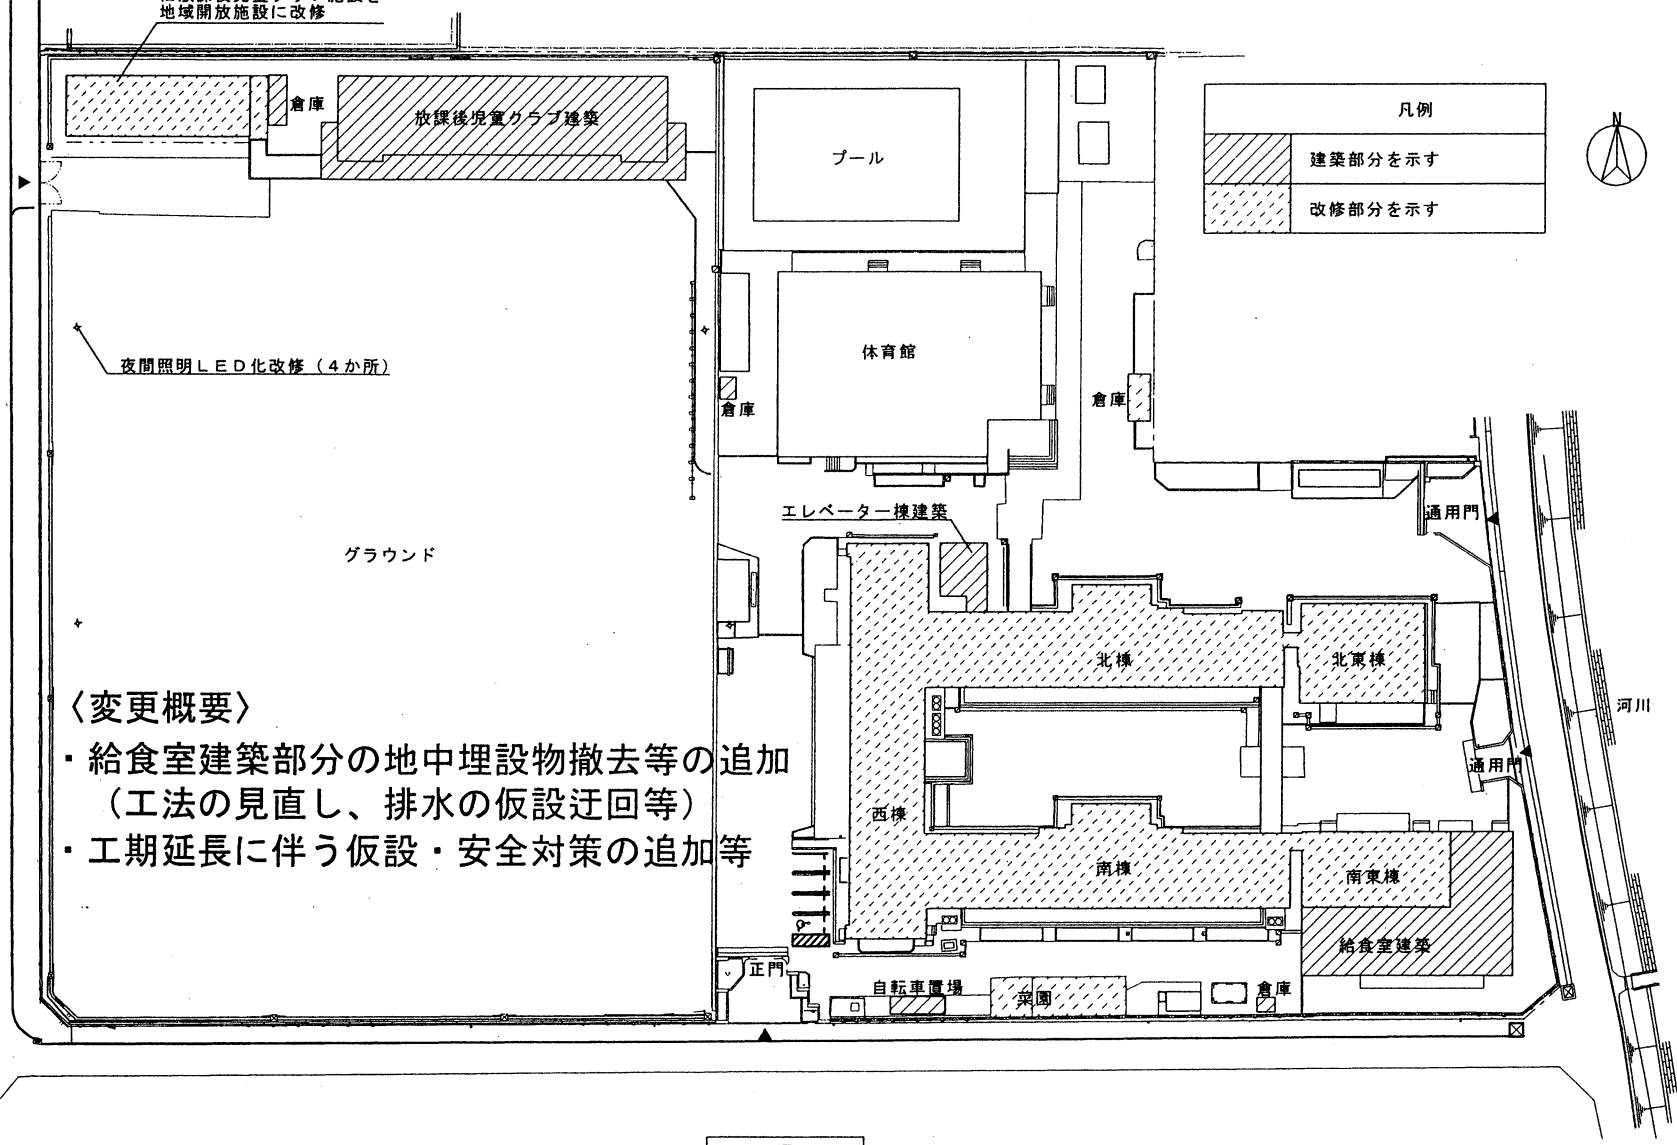

〈変更概要〉

- ・給食室建築部分の地中埋設物撤去等の追加
(工法の見直し、排水の仮設迂回等)
- ・工期延長に伴う仮設・安全対策の追加等

配置図

記 事	校 関				主 査		工事名称 長岡第九小学校給食室・放課後児童クラブ等整備工事	作成年月日 縮 尺	図面番号 配置図・仮設計画図
